

문서번호	안전관리실-3978	기안	실장	
보존기간	10년	이승영	12/30 허윤희	
보고일자	2024. 12. 30.	협 조		

2024년 경기문화재단 시설물 안전점검 결과보고



GyeongGi Cultural Foundation
경기문화재단

안전관리실

경기문화재단 주요업무 사전검토 항목 (☑ 또는 ■ 표시)

분류	항목	세부점검 내용	검토 완료	해당 없음	비고
사업 성과 관리	사업계획 적정성	◆ 사업목적 및 대상이 명확하고, 사업계획이 사업목적 달성에 적정한지 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		◆ 사업의 결과로 충분한 사회적 가치가 창출되는지 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	성과계획 적정성	◆ 사업의 추진계획에 따른 세부계획과 성과관리 계획은 구체적이고 합리적으로 설정되었는지 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	사업관리의 적정성	◆ 예산 집행 적정성을 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		◆ 사업 추진상황에 대한 정기적 모니터링을 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
내부 협업	관련 법령 및 절차 준수	◆ 업무 추진을 위한 관련 법령 및 절차를 검토하였습니까? □공직선거법 □청탁금지법 □일상감사 □계약심사 □기타 관련 법규(법령·조례·규정·규칙 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	관련법규
	부서 협력	◆ 타 부서와 협의 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? □인사 □예산 □계약 □홍보 □대관 □기타 □공동문제해결을 위한 협업 구조 마련	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	홍보방안	◆ 효과적인 홍보 방안을 검토하였습니까? □보도자료 □설명회 □누리집 □SNS □광고 □홍보물 제작	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	정보화사업 사전 검토	◆ 정보화사업 관련 사전 검토사항을 거쳤습니까? □정보화사업 예산 타당성 관련 □정보보안성 사전 검토 이행 □IT·전산 관련 부서 사전 협의 이행	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	중대재해대책	◆ 안전·보건 위험요인과 대책을 검토하였습니까? □안전규정 □안전교육 □위해요인 □관리계획 □비상계획 □기타	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
대외 협력	도·의회 협력	◆ 도 또는 의회와 사전 업무공유 및 협의를 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	협의내용
	타 기관 협력	◆ 타 기관과 사전 업무공유 및 협의를 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	협의기관
	도민 참여	◆ 도민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? □정책토론회 □설문조사 □도민공모 □기타	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	전문가 자문	◆ 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? □토론회 □자문위원회 □정책모임 □법률자문 □기타	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
정책 요소	문화다양성 및 사회적 약자	◆ 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? □여성 □아동 □장애인 □한부모 가정 □기타	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ESG 경영	◆ ESG 관점(환경, 사회, 지배구조)에서 검토하였습니까? □E(문화로 탄소중립) □S(문화로 상생공생) □G(문화로 경영혁신)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	공공갈등	◆ 이해관계인 파악, 지식재산권의 보호 등 갈등 발생 가능성과 대책을 검토하였습니까? (갈등요소:)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	정책 지속성	◆ 정책·계획의 지속가능성을 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	일자리 창출	◆ 일자리 창출 수를 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	개
	성인지	◆ 성인지적 관점(성평등 실현, 성인지 감수성, 성 차별적 요인 등)을 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		◆ 성별영향평가 검토 사업입니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	혐오표현 근절	◆ 혐오표현 근절을 위한 적절한 표현을 검토하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기타	정보공개	◆ 문서를 비공개로 설정했다면 법적 근거를 명확히 검토하였습니까? □공개 □부분공개(근거:) □비공개(근거:) ※정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	정보인권	◆ 이해관계자의 개인정보 수집 및 보안 조치 등을 확인하였습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	행정순화어	◆ 경기도 공공언어 대체어 및 일본어 투 용어 목록을 확인하였습니까? (예시 : 간담회 → 정담회, 가이드라인 → 지침 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	기록관리	◆ 결과물 생산 및 관리 방안을 검토하였습니까? □인쇄물 □PDF □영상 □사진 □지지씨	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2024년 경기문화재단 시설물 안전점검 결과보고

- 「중대재해처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법)」 시행('22. 1. 27.)에 따른 재단 소속 시설물로 인한 사고발생을 예방하기 위한 시기별 점검 결과를 보고 드립니다.

□ 2024년 시기별 시설물 점검 종합결과 (이상건수 / 조치완료)

구 분	설연휴 대비	해빙기 대비	풍수해 대비	추석연휴 대비	동절기 대비
경기상상캠퍼스	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
인계동사옥	0 / 0	2 / 2	2 / 2	1 / 1	1 / 1
경기창작센터	0 / 0	0 / 0	1 / 0	0 / 0	0 / 0
경기도박물관	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 0	0 / 0
경기도미술관	1 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
백남준아트센터	0 / 0	6 / 5	1 / 0	0 / 0	3 / 2
실학박물관	2 / 2	1 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
전곡선사박물관	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
경기도어린이박물관	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 1
경기북부어린이박물관	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1
합계	4 / 3	10 / 8	5 / 3	5 / 4	8 / 6

- 대부분의 이상 현장 조치 완료, 다음 점검 전 조치 완료 확인
○ 동절기 점검 이상의 경우 '25년 예산을 반영하여 조치 예정

I 추진 배경

- 시기별 시설물 안전사고 예방 및 사전점검 강화
○ 비상시 신속한 대응체계 유지


Ⅱ 점검 목적

□ 소속기관 시설물의 안전성 확보

- 재단 및 박물관·미술관 등 소속기관의 시설물에 대한 안전점검을 실시하여 시설물을 원활히 운영하고 사고예방에 만전을 기하고자 함
- 안정적 시설 운영 및 재난사고 예방
- 각종 위험요인으로 시설물 보호, 보존

Ⅲ 주요 점검 사항

□ 안전점검 절차

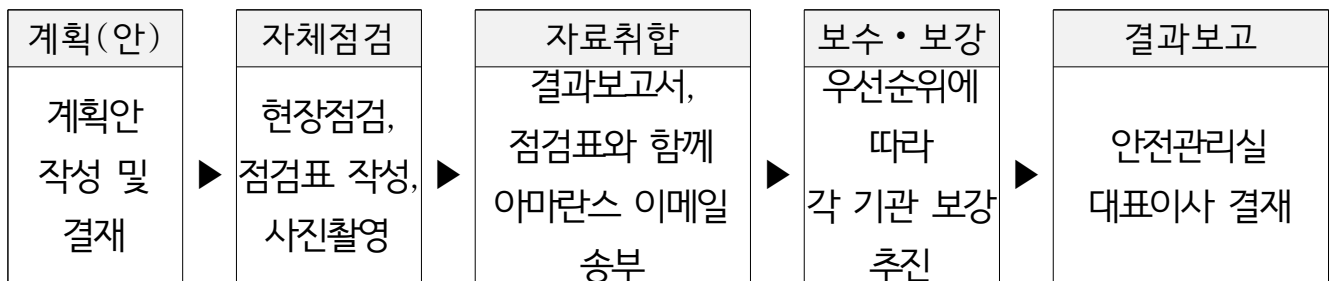

○ 점검방식 : 자체점검반 편성(안전관리실, 시설담당, 시설운영직)

○ 주요 점검사항

－ 건축물 점검

- 각종 공사 추진중인 기관은 공사장, 축대·옹벽 등 재해취약시설(재난위험시설, 개축 공사장 등)에 대한 사전점검 등 강화
- 주요 구조체 중대결함이나 위험징후 육안조사 확인

－ 화재예방 점검

- 소화기, 소화전, 경보설비 등 설치 및 이상 유무, 작동상태 확인
- 화재 대응 능력 및 각종 화재 위험물 관리 실태
- 전기 및 가스 설비 안전관리 실태, 옥외소화전, 감지기, CCTV, 방염 등

－ 기타설비 점검

- 배관밸브, 가스차단기 등 기계시설의 정상작동 여부
- 누전차단기 및 기타 전기시설의 정상 작동여부

○ 점검결과 조치

- － 즉시조치 : 현장에서 시정 가능한 사항 즉시 시정조치
- － 단기조치 : 단기간 내에 조치필요 및 개선 가능한 미흡 사항은 자체 가용자원, 유지관리비 등을 활용하여 빠른(1~3개월) 시일 내에 조치
- － 중장기조치 : 단기간 내에 조치가 필요 없거나, 비용 등의 문제로 조치가

어려운 경우 계획수립 후 조치(3개월 이상)

IV 점검 결과

□ 설 연휴 대비 시설점검

○ 점검일정 : 2024. 1. 22.(월) ~ 2. 6.(수)

○ 점검결과

구 분	부적합	시정	비 고
경기상상캠퍼스	0	0	-
인계동사옥	0	0	-
경기창작캠퍼스	0	0	6개동 중 4개동 리모델링 공사 진행 중
경기도박물관	1	0	야외 남자 화장실 누전 (차단기 OFF상태)
경기도미술관	0	0	-
백남준아트센터	2	2	옥상 통기관 고드름 제거, 미끄럼 방지 조치 완료
실학박물관	0	0	-
전곡선사박물관	0	0	-
경기도어린이박물관	0	0	-
경기북부어린이박물관	1	1	천장 누수에 따른 지속 관찰 (보고 당시 누수 없음)
합계	4	3	

※ 경기도박물관 - 해빙기 점검 전 조치 완료

□ 해빙기(한파) 대비 시설점검

○ 점검일정 : 2024. 3. 11.(월) ~ 3. 27.(수)

○ 점검결과

구 분	부적합	시정	비 고
경기상상캠퍼스	0	0	-
인계동사옥	2	2	배수로 적치 및 누수의심부위 확인(임시 조치 완료)
경기창작캠퍼스	0	0	-
경기도박물관	0	0	-
경기도미술관	0	0	-
백남준아트센터	6	5	옥상 방수 부분 균열 (상반기 조치예정) 2층 전시장 엑세스플로워 하중 불량 2층 비상방송 스피커 이탈 2층 전시장 유도등 점등 불량 1층 실외기 배관보온 불량 카페테라스 실리콘 불량
실학박물관	1	0	정문 출입 바닥 들뜸 현상 (5월 조치예정)
전곡선사박물관	0	0	-
경기도어린이박물관	0	0	-
경기북부어린이박물관	1	1	배수로 적치(현장 조치 완료)
합계	10	8	

※ 백남준아트센터 - 4. 8. ~ 4. 10. 방수업체를 통한 보강 조치 완료

실학박물관 - 4. 29. ~ 5. 28. 공사를 통한 보강 조치 완료

□ 풍수해 시기 대비 시설점검

○ 점검일정 : 2024. 6. 3.(월) ~ 6. 19.(수)

○ 점검결과

구 분	부적합	시정	비 고
경기상상캠퍼스	0	0	-
인계동사옥	2	2	야외주차장, 옥상 퇴적물 조치
경기창작캠퍼스	1	0	창의예술동 배수로 파손
경기도박물관	0	0	-
경기도미술관	0	0	-
백남준아트센터	1	0	야외 목재데크 파손
실학박물관	0	0	
전곡선사박물관	0	0	-
경기도어린이박물관	0	0	-
경기북부어린이박물관	1	1	건축물 옥외 배수로 퇴적물 조치
합계	5	3	

※ 경기창작센터 - 8. 23. 배수로 트렌치 교체를 통한 보강 조치완료

백남준아트센터 - 야외데크, 목재계단 보수를 통한 조치완료

□ 추석 연휴 대비 시설점검

○ 점검일정 : 2024. 8. 23.(금) ~ 8. 30.(금)

○ 점검결과

구 분	부적합	시정	비 고
경기상상캠퍼스	0	0	-
인계동사옥	1	1	배수로 및 배수구 퇴적물 제거 완료
경기창작캠퍼스	0	0	-
경기도박물관	1	0	옥상 방수부분의 균열로 중앙홀 누수발생
경기도미술관	0	0	-
백남준아트센터	0	0	-
실학박물관	0	0	-
전곡선사박물관	0	0	-
경기도어린이박물관	1	1	무대설비 점검을 통한 와이어장력 조절(자체) 실시
경기북부어린이박물관	2	2	가계철 내 온도 상승에 의한 승강기 고장 대비 온도습도 관리 실시 중청 창틀 크랙 보수
합계	5	4	

※ 경기도박물관 - 25년 예산반영과 설계를 통한 방수공법 선정 후 조치 예정

□ 동절기 대비 시설점검

○ 점검일정 : 2023. 11. 20.(월) ~ 11. 22(수)

○ 점검결과

구 분	계	부속합	시정	비 고
경기상상캠퍼스	—	—	—	
인계동사옥	1	1	1	폭설로 인한 전기실 누수
경기창작센터	—	—	—	
경기도박물관	—	—	—	
경기도미술관	—	—	—	
백남준아트센터	3	3	2	옥상방수표면 균열발생 - 조인트 관찰 후 조치예정 폭설로 인한 조경교목파손 제설작업 이후 잔여물 결빙 전도 위험
실학박물관	—	—	—	
전곡선사박물관	1	1	1	출입문 유격 발생
경기도어린이박물관	2	2	1	폭설로 인한 선쉐이드 파손 - 추가 공사 예정 화재 수신기 통신에러 발생 보수 진행
경기북부어린이박물관	1	1	1	기계실 내 우수 저수조 하부 미세누수
합계	8	8	6	

※ 백남준아트센터 - 지속관찰 후 2025년 예산반영 후 조치예정

경기도어린이박물관 - 즉각 현장 조치완료, 2025년 추가 복구 공사 예정

IV 기대효과 및 추후 계획

- 각 소속기관에 맞는 안전보건 체계 구축 가능
- 재해 예방활동 참여로 안전사고 감소
- 시설물 점검을 통한 안전확보 가능
- 사업장 점검 분위기 조성을 통해 근로자 사기 진작, 안전성 증대
- 산업재해 발생률 감소
- 미비사항은 2025년 예산반영 후 각 기관별 보완조치 예정
